

عكاظ


المصدر :

العدد : 15186 25-03-2008

التاريخ :

319 المساسل : 41 الصفحات :

١٦٧ مليوناً لمشاريع بلدية معتمدة و «تحت التنفيذ»

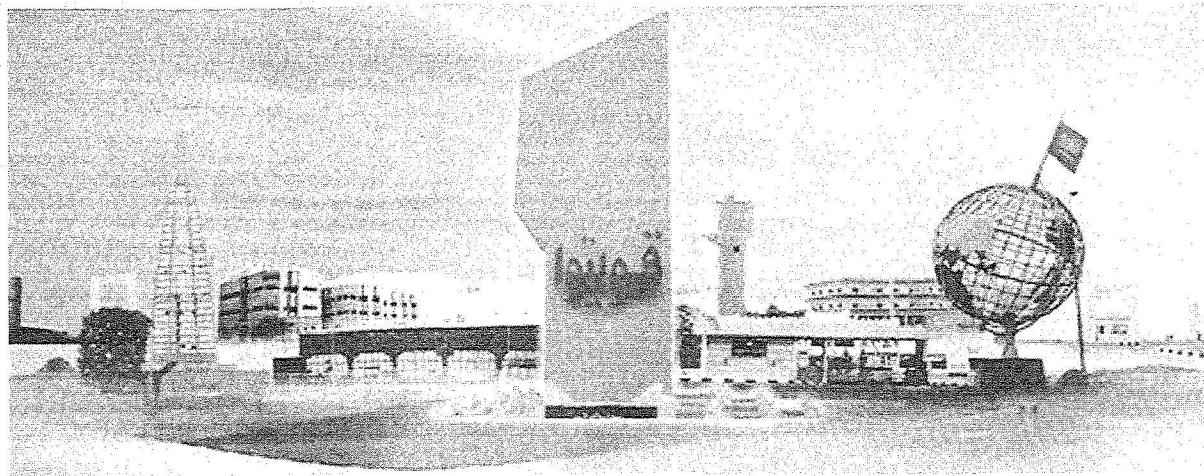



شلالات شرورة متنفس للأهالي

مالك الصبعري - شرورة

تشهد محافظة شرورة هذه الأيام تنفيذ العديد من المشاريع البلدية التطويرية منها على سبيل المثال مشاريع التجفيف والتحسين والخدمات وصحة البيئة ورصف وسفالة أغلب الأحياء والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء وذلك بالتركيز على تطوير مدينة الملك عبد العزيز وإنشاء مسطحات خضراء يرتادها المواطنين يتقدّم فيها بالخصوص إلى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الذين ينعمون بما حظي به هذه المحافظة من دعم واهتمام من لدن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولسي عهده ومتابعة من صاحب السمو الأمير منهل بن سعود عن عبد العزيز أمير المنطقة الذي يولي هذه (العروض) جل اهتماماته حتى أصبحت تضاهي أكبر محافظات المملكة وقد بدأت تلك المشاريع الحيوية ظهرها وبشهادتها الزائر وينعم بها المواطن.

صرح بذلك لعاصف رئيس بلدية شرورة فوزي بن يحيى بن عويضة الذي أكد أن البلدية قاتت متابعة أكثر من (٤١) مشروعًا بـ (١٢٣) مليون ريال ومن المشاريع الجاري العمل بها في الوقت الحالي مشروع سفلة وأرضية بالوديعة بمبلغ تناول وجار العمل في تسويير مشروع سفلته طرق وربط القرى شرورة ويخدم شرورة والوديعة مقبرة المنخل والخاشيم بتكلفة بلغت ٦٩٩,٩٨٠ ريالاً والخاشيم بتكلفة إجمالية نحو ٩,٦٥٠,٨٥٦,٦٠ حيث وصلت نسبة الانجاز نحو ٧٧٪ نسبة المدة المفترضة تحو ٦١٢٪. نسبة الانجاز ينتهي ٥٢٪ ونسبة المدة المفترضة نحو ١١٦٪. نسبة الانجاز نحو ٦١١٪ ونسبة المدة المفترضة نحو ٧٧٪. سفلة تسويير منتزه الملك عبد العزيز وتحميلاً وقد انتهت إنجازية مشروع تصريف مياه الأمطار ويخدم جهة من أحياء شرورة بتكلفة إجمالية نحو ٦,٩٧٤,٨٧٤ ريالاً.

وقد بلغت نسبة الانجاز نحو ٦٤٢٪ وهذا المشروع متاخر بنسبة المدة المفترضة ٣٩٪ ونسبة المدة المفترضة ١٠٥١٩,٨٣٢ ريالاً.

ووصلت نسبة الانجاز نحو ٩٤٪ ونسبة المدة المفترضة ٨٤٪ بسبب وفاة المقاول، مشروع إنشاء ملحق لمبني البلدية نحو ٩٩٩,٨٧٢,٦٤ ريالاً، مشروع تسويير مقابر بتكلفة ٨٥٨٪ وقد قام المقاول بالبناء وهو بمنطقة شرورة مرحلة ثانية وبتقدير شرورة مقابر بمركز في مرحلة التشطيب وقد بلغت نسبة الانجاز نحو ٧٦٪ ونسبة المدة المفترضة نحو ٥٣٪.

بها في الوقت الحالي مشروع سفلة وإنجازه من تسويير مقبرة المقبرة المنخلية والخاشيم بتكلفة بلغت ٦٩٩,٩٨٠ ريالاً ويدخل الأنجاز فيه نحو ٥٥٪ ونسبة المدة المفترضة تحو ٧٧٪. سفلة وإنارة بالوديعة وخدم قبرية الوديعة بتكلفة إجمالية بلغت ٢,٤٥٤,٩٣٠ ريالاً وقد بلغت نسبة الانجاز نحو ٨٩٪ ونسبة المدة المفترضة نحو ٩٦٪. الغربية الأخيرة وتلقي كلية المشروع بـ ١,٥١٩,٨٣٢ ريالاً.

ووصلت نسبة الانجاز نحو ٩٤٪ ونسبة المدة المفترضة ٨٤٪ بسبب وفاة المقاول، مشروع إنشاء ملحق لمبني البلدية نحو ٩٩٩,٨٧٢,٦٤ ريالاً، مشروع تسويير مقابر بتكلفة ٨٥٨٪ وقد قام المقاول بالبناء وهو بمنطقة شرورة مرحلة ثانية وبتقدير شرورة مقابر بمركز في مرحلة التشطيب وقد بلغت نسبة الانجاز نحو ٧٦٪ ونسبة المدة المفترضة نحو ٥٣٪.

نحو ٤٠٠ مشروع تثبيت زحف
الرimal ويخدم شهوره بتكلفة
إجمالية نحو ٩٩,٠٠٠ ريال
ووصلت نسبة الانجاز نحو ٦٤٪
ونسبة المدة المتبقية نحو ٣٦٪
مشروع تحسين وتحجيم المدخل
الجنوبي والشمالي لشورة
سفالة وأوصافه وإدارة لمخالطات
شورة مع الدراسة والإشراف
بمبلغ ١٣٥,٠٠٠ ريال و
ويشمل تحسين مدخل المحافظة
من جهة تيران ومدخل المحافظة
من جهة الوديعة وقد وصلت
نسبة الانجاز نحو ٣٤٪ والمدة
المقضية نحو ٣٠ شهور
عمل طبقة اسفالية للاحيا
بتكلفة إجمالية نحو ٣١٠,٠٠٠ ريال وافتتاح
سوق خضار ومسارع بالوديعة
بمبلغ ٧,٠٠٠ ريال سفلة
تحسين وتجهيز مدخل الوديعة
- المنفذ (طريق الملك عبدالعزيز)
بمبلغ ٣,٢٠٠,٠٠٠ ريال وإنشاء
سوق خضار ومسارع بالوديعة
بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال وربط القرى
شورة وربط القرى شورة
بمبلغ ١٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال
أكد رئيس البلدية بن عوضة
ان البلدية قاتل باعتماد
مخطط الآخاشيم على طريق
شورة - الخريجين رقم المخطط
٣/٣ ش.٤٢٪/٤٢٪/٢٪ عدد القطع
قطعة واعتماد مخطط مشعلية
الوديعة بالوديعة رقم المخطط
٢٪/٢٪/٤٢٪/٤٢٪/٣٪ عدد القطع
قطعة .
وتم اعتماد مخطط الوديعة
بالوديعة رقم المخطط ٢١٨٣/
٣ ش.٥١٤٧٪ عدد القطع
قطعة كما تم اعتماد مخطط حي
تشيا مع توجيهات أمير المنطقة
النزيه غرب حي الأمير مشعل (١)
وكذلك متابعة أصناف المنطقة
المبنى سعد فائز الشهري رقم المخطط ١٩ ش.٥١٤٧٪
